

ՄՊԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ


Անասունների առաջնային վերամշակման մսի արտադրամաս: Շինությունն իրենից ներկայացնում է մետաղական հիմնակմախքով կարկասային շենք: Հիմքերը միաձույլ երկաթբետոնից: Տանիքը և արտաքին պատերը նախատեսված է իրականացնել սենդվիչ պանելներով: Արտադրամասը համալրված է մսի առաջնային վերամշակման ամբողջական տեխնոլոգիական ցիկլի համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով և կոմունիկացիաներով: Արտադրամասը համապատասխանում է ՀՀ սանիտարահիգիենիկ պահանջներին, «Մսի և մսամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգին, հրդեհային և էլեկտրաանվտանգության նորմերին, աշխատանքի անվտանգության կանոններին: Արտադրամասի սարքավորումը և տարածքի սանիտարական մշակումն իրականացվում է մսի արտադրության մաքսային միության ցուցումներին համապատասխան: Արտադրամասի սարքավորումը պատրաստված է բարձրորակ սննդի չժանգոտվող պողպատից:

Արտադրամասի նշանակությունը

Խոշոր եղջերավոր անասունի սպանդ և առաջնային վերամշակում, ստացմամբ, պահպանմամբ և հետագա իրացմամբ.

- Թարմ միս, սառեցված կիսաջանդակներով և քառորդներով,
- Մաքրված ենթամթերք:

Մպանդանոցի ճարտարապետանախագծային որոշում (օրինակ)

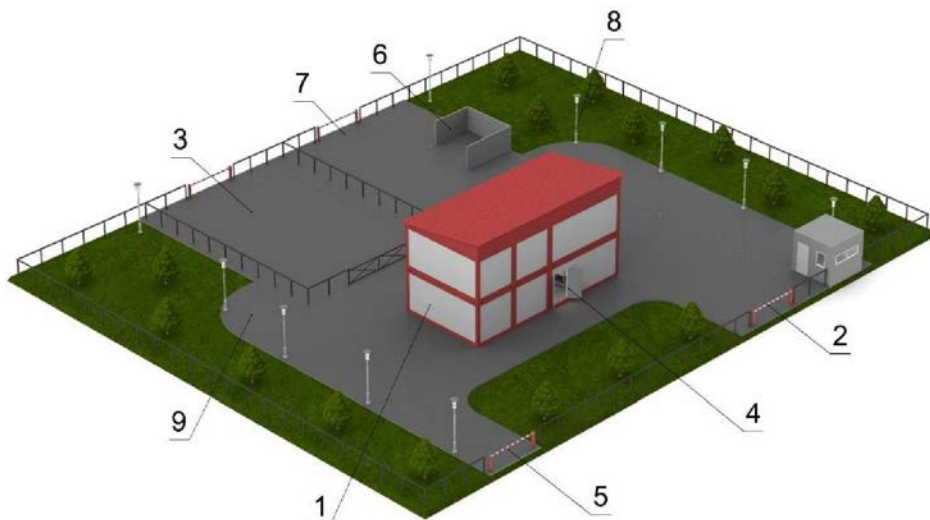

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Մսի արտադրամաս | 6. Աղբամանների համար հարթակ |
| 2. Տրանսպորտի մուտք | 7. Թափոնների հավաքման համար տրանսպորտի մուտք/ելք |
| 3. Տրանսպորտի ելք | 8. Լուսավորող հենակներ |
| 4. Հումքի ընդունման վայր | 9. Սանտեխնիկական դռնակ |
| 5. Պատրաստի արտադրանքի բեռնման մաս | |

Արտադրամասի տեխնիկական բնութագիր

Պարամետր	Չափ. միավ.	Նշանակություն
1. Չասփեր (գաբարիտային)	մմ x մմ x մմ	9000 x 6000 x 6000
2. Էլեկտրամատակարարում		
Սահմանված հզորությունը	կՎտ	12,5
Մուտքի յարումը	Վ	380
5 յարային էլեկտրական ցանց		L1, L2, L3, Γ, PE
3. Ջրամատակարարում		
Մատակարարվող ջրի որակը		ՍանՊահՎ հետ համապատասխան
Ջրի ծախսը	մ ³ /օրը	1
Մատակարարվող ջրի ճնշումը	ատմ	2 -ից 4
4. Շահագործման կլիմայական պայմանները		
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը	°C	- 45-ից + 50
Չնային ծանրաբեռնվածությունը	կգ/մ ²	400

Արտադրամասի ընդհանուր արժեքը

Կոնստրուկցիա (սյուները և հեծանները) հավաքվող նոր պողպատյա թիթեղից, ամրացված բարձր ամրության հեղուսներով և պատված երկշերտ գրունտով և հակակոռոզիոն ներկով: Պատեր՝ սենդվիչ պանելներ (արտաքին պատերը 100 մմ, թեթև եռաշերտ հրակայուն, ներքին պատերը՝ 60 մմ, հրակայուն):

Տանիք (Միալանջ, թեքությունը 5 %, ծածկը՝ սենդվիչ պանել՝ 100 մմ):


Վերը նկարագրած սպանդանոցային մասնաշենքի արժեքը 1 քմ-ի համար հինգ հարյուր քսան ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ:

Գինն իր մեջ ներառում է՝

- Հողային աշխատանքներ (հնարավոր է փոխվի՝ կախված ռելյեֆից):
- Հիմքեր (բետոնացում)
- Մետաղական կոնստրուկցիաներ
- Տանիք (ջրահեռացման համակարգով)
- Պատերի և տանիքի ծածկ(սենդվիչ պանելներ)
- Ինժեներական համակարգեր (ջուր, գազ, էլեկտրականություն, ջեռուցում, կոյուղի, օդափոխություն)
- Ներքին հարդարման աշխատանքներ
- Դռներ և պատուհաններ (մետաղապլաստե շրջանակներով)
- Կառույցի մոնտաժ և շահագործում (երաշխիքային շահագործում՝ շահագործման պահից սկսած 12 ամիս):

Արժեքն իր մեջ չի ներառում ԱԱՀ:

Արտադրամասի տեղաբաշխման և հիմնական սարքավորման կառուցվածքի սխեման

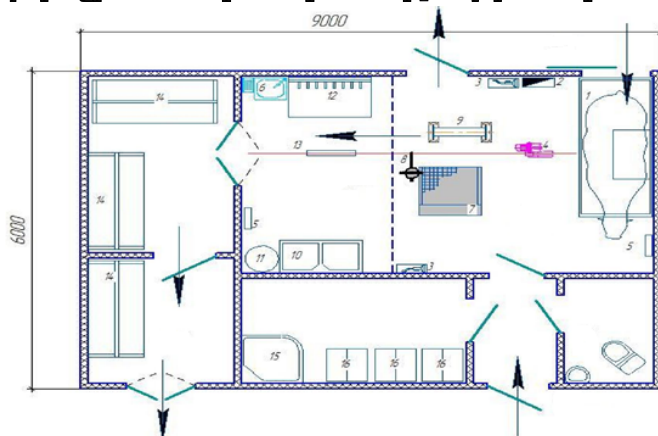

Հիմնական սարքավորման կազմը

№ հ/հ	Սարքավորման անվանումը	Քանակը, հատ
1	Անզգայացման փարախ	1
2	Անասունների անզգայացման սարք	1
3	Քնեցուցիչ ատրճանակ	2
4	Մոնոռելս ամբարձիչ էլեկտրական սայլակի վրա	1
5	Ախտահանիչ	2
6	Գործիքի ախտահանման լվացարան	1
7	Ամբարձիչ հարթակ	1
8	Մոնոգ երկայնական սղոցման համար	1
9	Մաշկող թմբուկ	1
10	Երկտեղանի լվացարան	1
11	Կուտակային ջրատաքացուցիչ	1
12	Անասնաբուժական հսկողության սեղան	1
13	Մոնոռելսային կշեռք	1
14	ԽԵԱ կիսաջանդակների համար կախիչ	3
15	Լոգախցիկ	1
16	Զգեստապահարան	3

Կոմպլեկտավորման մեջ նաև մտնում են

ա/հ	Դանակներ	4
ա/հ	Մուսաթ	2
ա/հ	Պլաստիկ արկղ	10
ա/հ	Պոլիուրեթանային գոգնոցներ	2
ա/հ	Դանակների համար պատյան	2
ա/հ	Ոտնակապ	1
ա/հ	Մեկ փեղկանի տրոյ	6
ա/հ	Սղոցի համար կարգավորիչ յծակ	1
ա/հ	Կահույի ճանապարհ, շերտավոր	9
ա/հ	Փորոտիքի տեղափոխման համար ոիկշա	1
ա/հ	Զրի բաք 200 լ (մաքրող լուծույթներ)	1
ա/հ	Դեզոդորգ	4
ա/հ	Պեղայային արտահոսքով զուգանակոնք, անտիվանդայ	1
ա/հ	Ձեռքերի համար լվացարան	1
ա/հ	Միջին ցերմաստիճանի սպիտ-համակարգ	1
ա/հ	ՊՎՔ շերտավարագույր, քառ. մ	36

Արտադրամասի մատակարարման պայմաններ

1. Մոնոաժային և շահագործման աշխատանքների ժամկետը՝ 30 օրից սկսած:
2. Երաշխիքային սպասարկում՝ մոնոաժային և շահագործման աշխատանքների ավարտման պահից սկսած 12 ամիս: Երաշխիքային վերանորոգման ժամկետ՝ 1 օրից սկսած: Երաշխիքային ժամկետը լրանալու դեպքում իրականացվում է սերվիսային սպասարկում:
3. Մոնոաժային և շահագործման աշխատանքների արժեքը կազմում է արտադրամասի արժեքի 15%:
4. Պատրաստի շինության արժեքը որոշվում է ըստ նախագծի և անասունների գլխաքանակի:

5. Սարքավորումը ձեռք բերելու համար առաջարկում ենք մեր ռուսական գործընկերոջ տվյալները՝ www.pt24.ru: Ցանկության դեպքում շինությունը կտրամադրենք սարքավորումներով հագեցված:
